

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler des Euregio-Gymnasiums!

Nach der jüngsten Sitzung des Arbeitskreises Schulgebäude Euregio am 05.08.2020 möchten wir Sie und euch über den aktuellen Stand der Gebäudesituation kurz vor Beginn des Unterrichts nach den Sommerferien informieren:

Schulbeginn

Zum Schulbeginn am 12. August 2020 werden wir über 36 Unterrichtsräume für 39 Klassen bzw. Kursgruppen verfügen. Drei Sporthallen werden für drei Klassen und die Halle 4 als Lehrerzimmer genutzt, sodass der Schulbetrieb komplett wiederaufgenommen werden kann. Voraussetzung dafür ist selbstverständlich, dass sämtliche Maßnahmen planmäßig weiter voranschreiten, gemäß dem Zeitplan umgesetzt werden und es keine Störungen gibt.

Arbeiten am Bestandsgebäude

Zahlreiche Baufirmen arbeiten weiter mit Hochdruck daran, dass die Teile des Bestandsgebäudes (70er-Räume, 80er-Räume, die drei außenliegenden Fachräume für Biologie sowie die drei Räume 141, 143 und 144) wieder genutzt werden können. Bisher laufen alle Arbeiten planmäßig. Unter der Voraussetzung, dass es weiterhin keine Störungen gibt, sind diese Räume zum Schulbeginn wieder nutzbar.

Mobile Gebäudeteile

Seit dieser Woche werden die mobilen Gebäudeteile geliefert. Für sie liegt – unter der Voraussetzung, dass es keine Störungen gibt, folgende Terminplanung vor:

Mobile Gebäudeteile	Fertigstellung voraussichtlich
Gebäude A & B	24. & 26. August 2020
Gebäude Biologie (Sammlung)	14. August 2020
Gebäude C & D	16. September 2020
Gebäude E & F	25. September 2020
Mensa	2. Oktober 2020

Mit Fertigstellung der Gebäude A & B wird sich die Raumsituation deutlich entspannen. Dann stehen 10 zusätzliche Klassenräume sowie einige Differenzierungsräume zur Verfügung. Ab Ende August stehen auch die Turnhallen 1 - 3 wieder für den Sportunterricht zur Verfügung.

Auf der Rasenfläche zwischen Soccerfeld und Ascheplatz werden ab dem 24.08. sukzessive die Gebäude C, D, E, F sowie die Mensa errichtet. Aufgrund des hohen Baustellenverkehrs gehen die fünf Gebäude allerdings erst nach Abschluss der Baumaßnahmen GEMEINSAM in Betrieb, voraussichtlich am 2. Oktober 2020.

Grüne Klassenzimmer

Die sogenannten „grünen Klassenzimmer“ wurden bestellt. Leider beträgt die Lieferzeit aufgrund der hohen Nachfrage derzeit 4 bis 8 Wochen. Insofern rechnen wir mit einer Lieferung im Laufe des Septembers. Ggf. wird eines der Grünen Klassenzimmer noch an einen anderen Standort als ursprünglich geplant verlegt.

Skyliner

Die Stadtparkasse stellt freundlicherweise zum Schulstart für zwei Wochen ihren Riesen-Schattenspendler, den „Skyliner“ (bekannt von vielen Veranstaltungen auf dem Marktplatz in Bocholt) zur Verfügung.

Verkehrliche Situation

Die Straße „In der Hardt“ wird voraussichtlich ab Ende September ein verkehrsberuhigter Bereich (Spielstraße). Zusätzlich werden Blumenkübel zur Reduzierung der Geschwindigkeit aufgestellt. Dies ist aufgrund des Baustellenverkehrs jedoch erst möglich, wenn die mobilen Gebäudeteile auf der Rasenfläche zwischen Soccerfeld und Ascheplatz geliefert und montiert wurden.

Essensversorgung

Aus der Elternpflegschaft wurde der Wunsch geäußert eine Essensversorgung für die Zeit, bis die Mensa (frühestens am 02.10.2020) in Betrieb geht, anzubieten. Die Stadt hat zugesagt, Möglichkeiten zu eruiieren.

Ausstattung

Weiterhin streben wir das Ziel der Gleichwertigkeit aller Unterrichtsräume in der technischen Ausstattung an.

- Liefertermin digitale Tafeln: 8 digitale Tafeln werden voraussichtlich zum 14.08.2020, spätestens aber zum 18.08.2020, geliefert, so dass in den ersten 5 Klassen im Gebäude A direkt mit Touchboards gearbeitet werden kann. Nach derzeitigem Stand werden für das Gebäude B 3 mobile Touchboards (davon 2 ohne Flügel) und zwei mobile Kreidetafeln zur Verfügung stehen. Die Kreidetafeln werden am 7./8. September gegen Touchboards ausgetauscht.
- Die Stadt setzt sich aber nochmals mit der Lieferfirma in Verbindung, um möglichst zum 14. bzw. 18.08. zwei weitere digitale Tafeln geliefert zu bekommen, damit die Kreidetafeln im Gebäude B nicht aufgestellt werden müssen.
- Die Lieferung der 13 übrigen digitalen Tafeln erfolgt rechtzeitig zur Inbetriebnahme der Gebäude C/D, E/F.
- Der Umbau der im geschlossenen Hauptgebäude fest installierten Tafeln ist für die Herbstferien vorgesehen. Diese Tafeln werden in den Bestandsgebäuden I bis III neu installiert.

Das Gebäude ist bereits am Glasfaser-Breitband-Internet angeschlossen. Es muss noch die Verkabelung im Haus installiert werden, damit uns zukünftig im gesamten Gebäude schnelles Internet zur Verfügung stehen wird. Auch in den mobilen Gebäudeteilen soll schnelles Internet zur Verfügung stehen. Ein genauer Zeitpunkt für den Abschluss der Arbeiten steht noch nicht fest; uns wurde aber in Aussicht gestellt, dass sie für die Bestandsgebäude innerhalb der ersten zwei Schulwochen abgeschlossen sein sollen.


Weitere Informationen zur Organisation des Schulbeginns und zur Einführung von Office 365 als neuer Kommunikationsplattform für Schüler, Lehrer und Eltern werden in Kürze folgen.

Herzliche Grüße und noch schöne Restferien!

Christoph Schultheiß und Jan-Bernd Lepping


Anlage 1: Planung der Gebäude auf der Rasenfläche zwischen Soccerfeld und Aschenplatz

Anordnung der Gebäudeteile C, D, E, F wie besprochen am 05.08.20

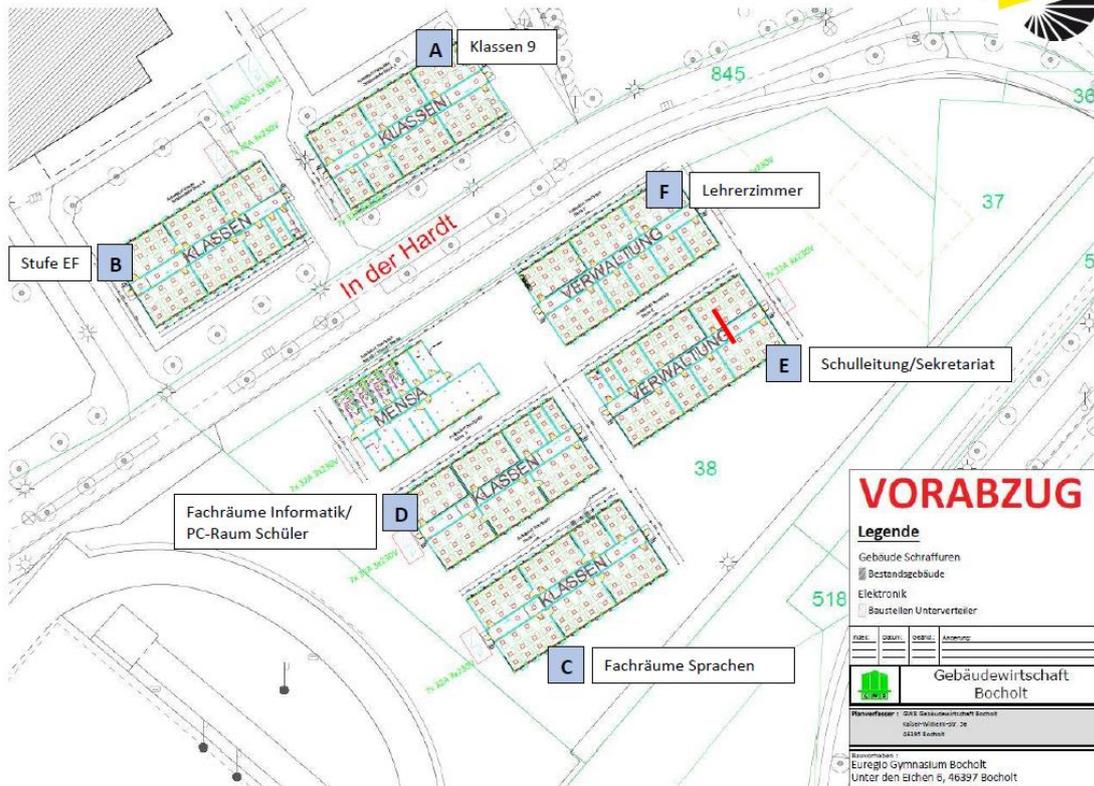


Anlage 2: Planung der Spielstraße

Spielstraße | Euregio Gymnasium

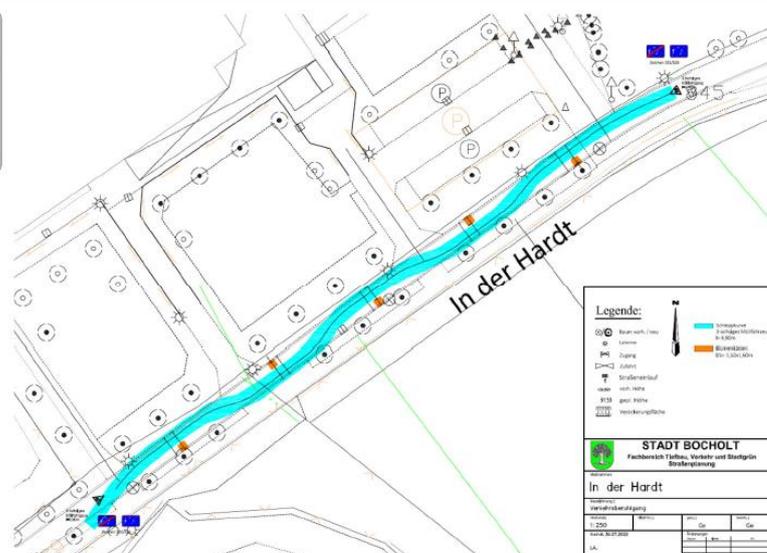

Gebäudewirtschaft Bocholt | Euregio Gymnasium | 05.08.2020

Anlage 3: Planung für den Skyliner

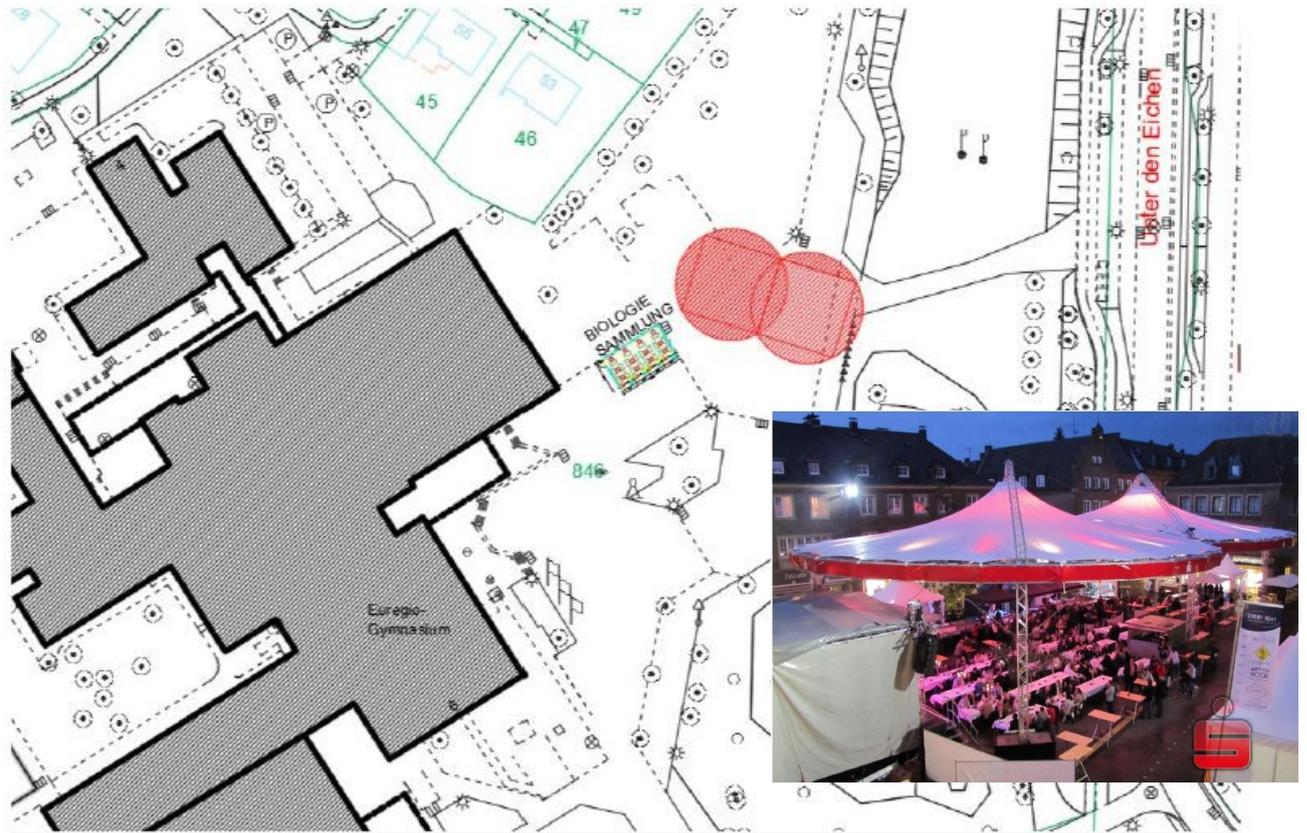

Anlage 4: Impressionen von den Baustellen

Errichtung von Gebäude B am 04.08.2020: <https://youtu.be/DCf11LYDzO8>

Errichtung von Gebäude A am 05.08.2020: <https://youtu.be/4xG3VTTflnA>

